

GC1300

動作確認チェックシート

検査日	2019年 1月 18日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	洗浄機	電源	三相200V		
型式	ME11265	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	東邦テクノロジー	外寸	W5900 D1460 H2000		
機械Ser.No		動作確認使用基盤			
製造年月		厚み1mm 300mm角 ガラス			

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

備考(動作確認内容・不具合内容等) 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

- 1, 外観確認 目立つ大きなキズ無し
- 2, 動作確認
 - ・ローダー、アンローダー部の昇降 OK
 - ・各処理工程のコンベア正転逆転 OK
 - ・コンベア搬送速度変更 OK
 - ・扉の開閉 OK
 - ・アライナーの開閉 OK
 - ・各水流センサー、風量センサー、ポンプ動作 OK
 - ・各部スイッチ動作 OK
 - ・自動運転にて一連の動作 OK
- 3, 動作確認は水、エアを仮配管にて用いて行った。
- 4, 設定・メンテナンスのパスワード
→タッチパネルに表示されている時間
- 5, 自動・手動の切り替えは、スイッチを5秒程度長押し




コンベア正・逆転 OK
扉開閉 OK



ローダー昇降 OK



仮配管にて動作確認

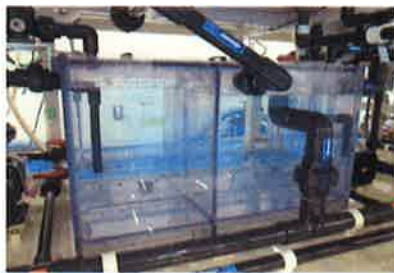

タンクや配管からの水漏れ確認 OK

取扱説明書 (有)

修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者
2019年 8月19~27日	設置、配線つなぎ込み、仮配管設置、溶液を用いた動作確認	雨宮・飯塚

File Maker入力	(備考欄コメント)	[責任者]
動作 OK (NG)	作業工数[40 H]	
検査担当者[雨宮・飯塚]		
